

## DODATOK Č. 5

### K ZMLUVE O DIELO

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany** :

**Objednávateľ** :

**Obchodné meno:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ** :

**Obchodné meno:** Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 581/B

zastúpený v zmysle podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:

Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina na základe plnomocenstva reg. zn. 2022/01/2115

Ing. Jozef Tomčík, zástupca riaditeľa závodu Žilina na základe plnomocenstva reg. zn. 2022/01/2125

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Beniač, PhD.

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Tomčík, zástupca riaditeľa

stavbyvedúci: Ing. Slavomír Mečár, vedúci VS4

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

telefón: +421 907 711 391

e-mail: [slavomir.mecar@doprastav.sk](mailto:slavomir.mecar@doprastav.sk)

(ďalej aj len ako „**zhotoviteľ**“)

### **Preambula**

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „**Zmluvné strany**“) po vzájomnej dohode v zmysle Čl. IV, bod 2. ZOD a Zápisu zo stavebného denníka, listy č. 0169262, 0169263 a 0169264 dopĺňajú a upravujú ZOD č. Objednávateľa 47/4/2021, č. zhotoviteľa Z1/2021/073/03 zo dňa 13.7.2021 vrátane Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 (ďalej len „**Zmluva**“) týmto Dodatkom č. 5 (ďalej ako „**Dodatok**“) nasledovne:

### **Článok I. Predmet Dodatku**

1. Článok IV. Čas plnenia – dopĺňa sa o bod 7. nasledovne:

„7. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu prerušovania prác v dôsledku nevhodných klimatických podmienok prílohu č. 1 – Harmonogram prác nahrádza Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 16.02.2023, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.“

### **Článok XIII. Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 5 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 5 spolu s Dodatkom č. 1, Dodatkom č. 2, Dodatkom č. 3 a Dodatkom č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Objednávateľa 47/4/2021, č. Zhotoviteľa Z1/2021/073/03 zo dňa 13.7.2021.
3. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.
4. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
5. Dodatok sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevhodných podmienok.

Neoddeliteľnými súčasťami tohoto Dodatku sú:

**Príloha č. 1** - Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 16.02.2023

**Príloha č. 2** - Kópia Zápisu zo stavebného denníka, listy č. 0169262, 0169263, 0169264 a 0169268

**[Podpisy Zmluvných strán]**

V Trenčíne, dňa 02. 03. 2023

V Žiline, dňa 01. 03. 2023

**Za objednávateľa:**


**Za zhotoviteľa:**

**Ing. Radovan Karkuš**  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

**Ing. Martin Beniač, PhD.**  
riaditeľ závodu Žilina  
v súlade s podpisovým poriadkom  
Doprastav, a.s.

**Ing. Jozef Tomčík**  
zástupca riaditeľa závodu Žilina  
v súlade s podpisovým poriadkom  
Doprastav, a.s.

entifikácia	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodoce	Názvy zdrojov
1	<b>Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany</b>	545 dni	Št 4.11.21	Str 3.5.23		
2	Dátum začatia prác	1 deň	Št 4.11.21	Pi 5.11.21		
3	Vytyčenie inžinierskych sietí, osadenie DDZ	1 deň	Po 8.11.21	Ut 9.11.21 2SS		
4	<b>D001 – Dočasná obchádzková komunikácia</b>	201 dni	Ne 18.9.22	Pi 7.4.23		
5	zriadenie	25 dni	Ne 18.9.22	Št 13.10.22 41FF+14 dr		
6	odstránenie	10 dni	Ut 28.3.23	Pi 7.4.23 28		
7	<b>D101 – Cesta I/84</b>	182 dni	Št 13.10.22	Št 13.4.23		
8	búracie práce a frézovanie	30 dni	Št 13.10.22	So 12.11.22 5		
9	konštrukčné vrstvy	30 dni	Ut 14.3.23	Št 13.4.23 26		
10	<b>D102 – Cesta III/1799</b>	167 dni	Št 13.10.22	Str 29.3.23		
11	búracie práce a frézovanie	30 dni	Št 13.10.22	So 12.11.22 5		
12	konštrukčné vrstvy	30 dni	Po 27.2.23	Str 29.3.23 25		
13	<b>D103 – Chodníky</b>	45 dni	Ut 7.3.23	Pi 21.4.23		
14	rekonštrukcia oporného múru	14 dni	Pi 7.4.23	Pi 21.4.23 6		
15	chodníky	45 dni	Ut 7.3.23	Pi 21.4.23 14FF		
16	<b>D104 – Preloženie ihriska a oplatenia pri Športoteke Raketa</b>	528 dni	Ut 9.11.21	Pi 21.4.23		
17	realizácia ihriska	14 dni	Pi 7.4.23	Pi 21.4.23 6		
18	búranie ihriska	10 dni	Ut 9.11.21	Pi 19.11.21 3		
19	<i>prerušenie prác: 19.11.2021-19.4.2023</i>	151 dni	Pi 19.11.21	Ut 19.4.22 18		
20	<b>D201 – Rekonštrukcia a rozšírenie mosta ponad rieku Nitra</b>	166 dni	Št 13.10.22	Ut 28.3.23		
21	búranie a výkopové práce	20 dni	Št 13.10.22	Str 2.11.22 5,41		
22	založenie mosta- mikropilóty	20 dni	Str 2.11.22	Ut 22.11.22 21		
23	spodná stavba	30 dni	So 12.11.22	Po 12.12.22 22SS+10 dr		
24	<i>preškoľovanie prác v období: 16.12.2022 - 28.2.2023</i>	45 dni	Pi 16.12.22	Po 30.1.23		
25	nosná konštrukcia mosta	27 dni	Ut 31.1.23	Po 27.2.23 24FS+1 deň		
26	realizácia ríms a izolácie	15 dni	Po 27.2.23	Ut 14.3.23 25		
27	vrstvy vozovky	2 dni	Ut 14.3.23	Št 16.3.23 26		
28	zábradlie a zvodidla	12 dni	Št 16.3.23	Ut 28.3.23 27		
29	<b>D301 – Úprava rieky Nitra</b>	215 dni	Ne 18.9.22	Pi 21.4.23		
30	odkopy	10 dni	Ne 18.9.22	Str 28.9.22 5SS		
31	realizácia kamenného opevnenia	14 dni	Pi 7.4.23	Pi 21.4.23 6		
32	D601 – Prekládka káblov v Slovák Telekom	12 dni	Ut 19.4.22	Ne 1.5.22 19		
33	D602 – Nasvetlenie priechodu pre chodcov	12 dni	Pi 21.4.23	Str 3.5.23 15		
34	<b>D701 – Prekládka STL plynovodu SPP-d</b>	163 dni	Ut 19.4.22	Št 29.9.22 19		
35	realizácia premostenia	10 dni	Ut 19.4.22	Pi 29.4.22 19		
36	dopad zistenia plynovej prípojky k Športoteke Raketa v trase dočasnej obchádzkovej komunikácie D001 - spracovanie zmeny PD D701, spracovanie a odsúhlasenie rozpočtu odstránenia prípojky	65 dni	Pi 29.4.22	Ne 3.7.22 35		
37	prekládka plynovodu	15 dni	Ne 3.7.22	Po 18.7.22 36		
38	odstránenie plynovej prípojky k Športoteke Raketa	10 dni	Po 18.7.22	Št 28.7.22 37		
39	administratívne úkony ku kolaudácii, overenie geometrických plánov, dohody o vecných bremenách	28 dni	Št 28.7.22	Št 25.8.22 38		
40	<i>povalenie predčasného užívania prekážky STL plynovodu</i>	32 dni	Št 25.8.22	Po 26.9.22 39		
41	ostrý prepoj	3 dni	Po 26.9.22	Št 29.9.22 40		

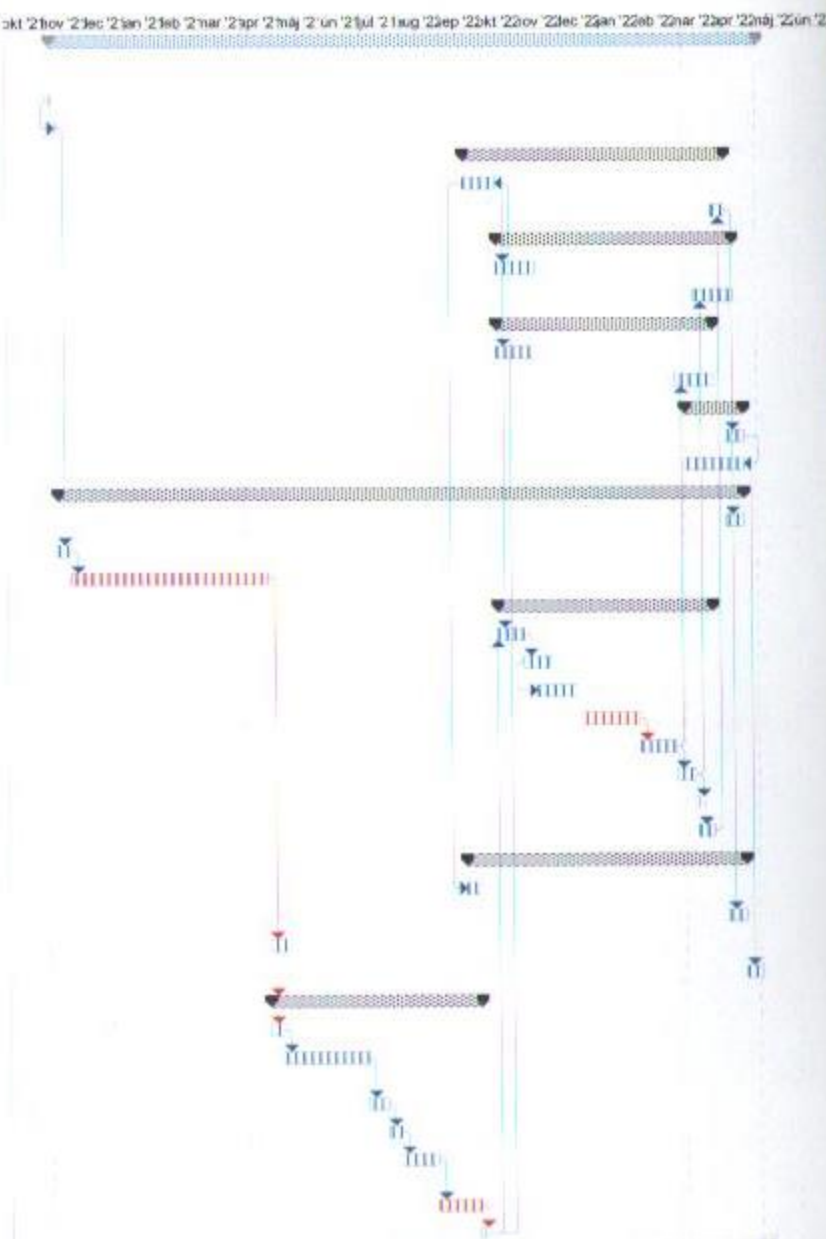

Projekt: Nedožery-Brezany  
Datum: 20.2.2023

Úkol		Souhrn projektu		Neaktivný súhrn		Manuálny súhrn		Externý medzník	
Rozdelení		Vnější úkoly		Manuálna úloha		Iba začiatok		Průběh	
Mílník		Vnější mílník		Iba trvanie		Iba dokončenie		Konečný termín	
Souhrny		Neaktivný medzník		Manuálny súhrn		Externé úlohy			
