

DODATOK č. 4
k Zmluve o dielo č. 47/4/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

Doprastav, a.s.

sídlo : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
realizačný závod : Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
IČO : 31 333 320
DIČ : 2020372497
IČ DPH : SK7120000206

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka číslo 581/B

zastúpený v zmysle podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:

Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina,
Ing. Jozef Tomčfk, zástupca riaditeľa závodu Žilina
poriadku

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Beniač, PhD.

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Tomčfk, zástupca riaditeľa

stavbyvedúci: Ing. Slavomír Mečár, vedúci VS4
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

telefón: +421 907 711 391

e-mail: slavomir.mecar@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 13.07.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 47/4/2021 (ďalej aj len ako „Zmluva“), v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 13.07.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 08.08.2022, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany“ (ďalej aj len ako „Dielo“).

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s Článkom XIII. druhý odsek Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok č. 4“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Článku IV. Čas plnenia sa za posledný odsek 5 dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie nasledovne:

„6. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu skutočností, že v dôsledku prerušenia stavebných prác pre vykonanie administratívnych úkonov súvisiacich s vydaním Rozhodnutia o povolení predčasného užívania preložky STL plynu (D701) Okresným úradom Prievidza, prílohu č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 23.06.2022 nahrádza Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 05.10.2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.“

2. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 4 bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 sú:
Príloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 05.10.2022
Príloha č. 2 – Kópia Zápisu zo stavebného denníka, listy č. 0176090, 0169242, 0048375, 0048376

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa27. 10. 2022

V Žiline, dňa27.10. 2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja




Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ závodu Žilina
v zmysle Podpisového poriadku
Doprastav, a.s.



Ing. Jozef Tomčík
zástupca riaditeľa závodu Žilina
v zmysle Podpisového poriadku
Doprastav, a.s.

číslo úlohy	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Prechodová	Názvy zdrojov	okt. 2022	nov. 2022	dec. 2022	jan. 2023	feb. 2023	mar. 2023	apr. 2023	máj 2023	jun 2023	júl 2023	aug. 2023	sept. 2023	okt. 2023	nov. 2023	dec. 2023	jan. 2024	feb. 2024	mar. 2024						
1	Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany	483 dni	Št 4.11.21	Št 2.3.23			[Gantt bar for main project]																							
2	Dátum začatia prác	1 deň	Št 4.11.21	Pi 5.11.21			[Gantt bar for start date]																							
3	Vytyčenie inžinierskych sietí, osadenie DDZ	1 deň	Po 8.11.21	Ut 9.11.21	2SS		[Gantt bar for surveying]																							
4	D001 – Dočasná obchádzková komunikácia	151 dni	Ne 18.9.22	Št 16.2.23			[Gantt bar for temporary communication]																							
5	zriadenie	25 dní	Ne 18.9.22	Št 13.10.22	40FF+14 dn		[Gantt bar for establishment]																							
6	odstránenie	10 dní	Po 6.2.23	Št 16.2.23	27		[Gantt bar for removal]																							
7	D101 – Cesta I/64	117 dní	Št 13.10.22	Ut 7.2.23			[Gantt bar for road I/64]																							
8	burácke práce a tržezovanie	30 dní	Št 13.10.22	Se 12.11.22	5		[Gantt bar for earthwork]																							
9	konštrukčné vrstvy	30 dní	Ne 6.1.23	Ut 7.2.23	24		[Gantt bar for construction layers]																							
10	D102 – Cesta III/1799	117 dní	Št 13.10.22	Ut 7.2.23			[Gantt bar for road III/1799]																							
11	burácke práce a tržezovanie	30 dní	Št 13.10.22	So 12.11.22	5		[Gantt bar for earthwork]																							
12	konštrukčné vrstvy	30 dní	Ne 6.1.23	Ut 7.2.23	24		[Gantt bar for construction layers]																							
13	D103 – Chodníky	45 dní	Po 16.1.23	Št 2.3.23			[Gantt bar for sidewalks]																							
14	rekonštrukcia oporného múru	14 dní	Št 16.2.23	Št 2.3.23	6		[Gantt bar for retaining wall]																							
15	chodníky	45 dní	Po 16.1.23	Št 2.3.23	14FF		[Gantt bar for sidewalks]																							
16	D104 – Preloženie ihriska a oplotenia pri Športotekári Raketa	478 dni	Ut 9.11.21	Št 2.3.23			[Gantt bar for sports field]																							
17	realizácia ihriska	14 dní	Št 16.2.23	Št 2.3.23	6		[Gantt bar for field realization]																							
18	buranie ihriska	10 dní	Ut 9.11.21	Pi 19.11.21	3		[Gantt bar for field excavation]																							
19	preušetrenie prác 18.11.2021-19.4.2022	161 dni	Pi 19.11.21	Ut 18.4.22	16		[Gantt bar for work review]																							
20	D201 – Rekonštrukcia a rozšírenie mosta ponad rieku Nitra	116 dní	Št 13.10.22	Po 6.2.23			[Gantt bar for bridge reconstruction]																							
21	buracie a výkopové práce	20 dní	Št 13.10.22	Str 2.11.22	5:40		[Gantt bar for excavation]																							
22	založenie mosta- mikropilóty	20 dní	Str 2.11.22	Ut 22.11.22	21		[Gantt bar for micropiles]																							
23	spodná stavba	30 dní	So 12.11.22	Po 12.12.22	22SS+10 dn		[Gantt bar for substructure]																							
24	nosná konštrukcia mosta	27 dní	Po 12.12.22	Ne 6.1.23	23		[Gantt bar for main structure]																							
25	realizácia ríms a izolácie	15 dní	Ne 6.1.23	Po 23.1.23	24		[Gantt bar for sills and insulation]																							
26	vrstvy vozovky	2 dni	Po 23.1.23	Str 25.1.23	25		[Gantt bar for pavement layers]																							
27	zábradlie a zvodniče	12 dní	Str 25.1.23	Po 6.2.23	26		[Gantt bar for guardrails and drains]																							
28	D301 – Úprava rieky Nitra	165 dní	Ne 18.9.22	Št 2.3.23			[Gantt bar for river improvement]																							
29	odkopy	10 dní	Ne 18.9.22	Str 28.9.22	5SS		[Gantt bar for excavations]																							
30	realizácia kamenného opevnenia	14 dní	Št 16.2.23	Št 2.3.23	6		[Gantt bar for stone reinforcement]																							
31	D601 – Prekážka káblov Slovak Telekom	12 dní	Ut 19.4.22	Ne 1.5.22	19		[Gantt bar for cable barrier]																							
32	D602 – Nasvetlenie prechodu pre chodcov	20 dní	Ne 6.1.23	So 26.1.23	9SS		[Gantt bar for pedestrian crossing lighting]																							
33	D701 – Prekážka STL plynovodu SPP-d	163 dni	Ut 19.4.22	Št 29.9.22	19		[Gantt bar for gas pipeline barrier]																							
34	realizácia premostenia	10 dní	Ut 19.4.22	Pi 29.4.22	19		[Gantt bar for crossing realization]																							
35	dopad zistenia plynovej prípojky k Športotelu Raketa v trase dočasnej obchádzkovej komunikácie D001 - spracovanie zmeny PD D701, spracovanie a odsúhlasenie rozpočtu odstránenia prípojky	65 dní	Pi 29.4.22	Ne 3.7.22	34		[Gantt bar for gas connection impact]																							
36	prekážka plynovodu	15 dní	Ne 3.7.22	Po 18.7.22	35		[Gantt bar for gas pipeline barrier]																							
37	odstránenie plynovej prípojky k Športotelu Raketa	10 dní	Po 18.7.22	Št 28.7.22	36		[Gantt bar for gas connection removal]																							
38	administratívne úkony ku kalaudácii, overenie geometrických plánov, dohody o vecných bremenách	28 dní	Št 28.7.22	Št 25.8.22	37		[Gantt bar for administrative tasks]																							
39	povolenie predčasného užívania preložky STL plynovodu	32 dni	Št 25.8.22	Po 26.9.22	38		[Gantt bar for gas pipeline use permit]																							
40	ostrý prepis	3 dni	Po 26.9.22	Št 29.9.22	39		[Gantt bar for final drawing]																							

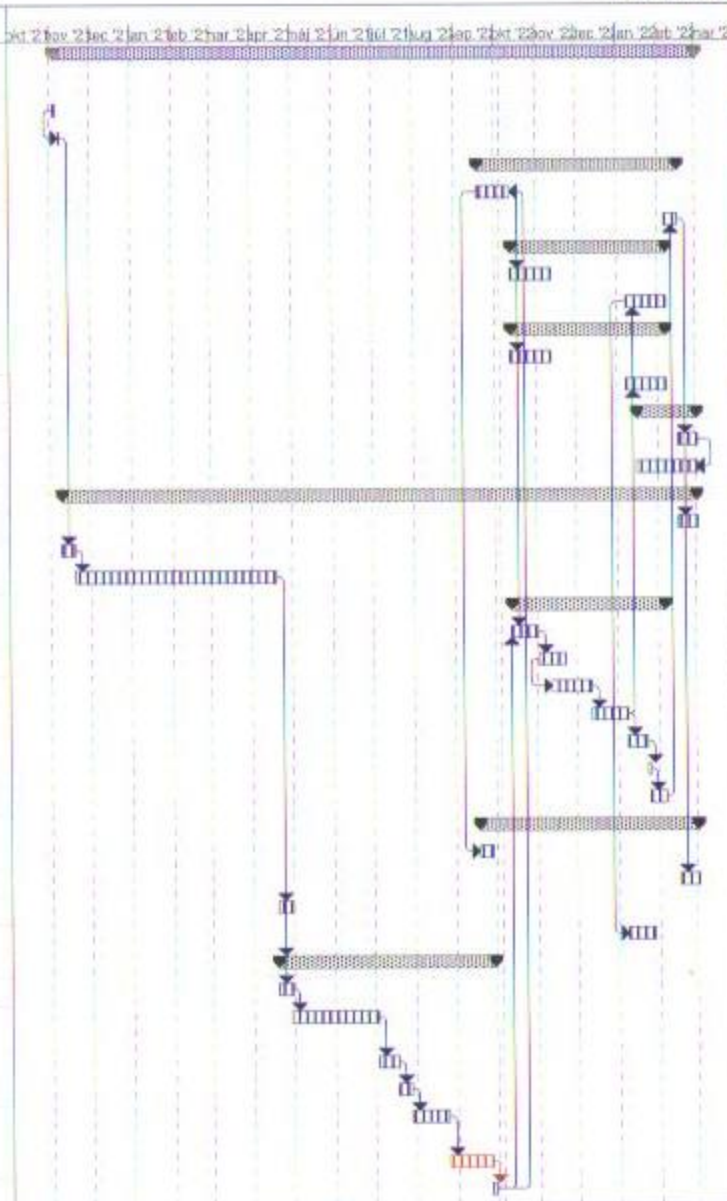

Projekt: Nedožery-Brezany
 Datum: 5.10.2022

Úkol	[Solid bar]	Souhrn projektu	[Dashed bar]	Neaktivní súhrn	[Dotted bar]	Manuálny súhrn	[Diamond]	Externý medzník	[Thick bar]
Rozšírení	[Dotted bar]	Vnější úkol	[Thick bar]	Manuálna úloha	[Diamond]	Iba začiatok	[Thick bar]	Prúbeh	[Thin bar]
Milník	[Diamond]	Vnější milník	[Diamond]	Iba trvanie	[Dotted bar]	Iba dokončít	[Thick bar]	Konečný termín	[Diamond]
Souhrnný	[Thick bar]	Neaktivní medzník	[Thin bar]	Manuálny súhrn	[Diamond]	Externé úlohy	[Diamond]		
