

112/4/2025

ZMLUVA O DIELO

OBJEDNÁVATEĽ Č.ZOD:

ZHOTOVITEĽ Č.ZOD: 2025/EA/01/011

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 991/B

štatutárny zástupca: Ing. Branislav Lukáč , konateľ

Ing. Milada Kušnírová , konateľka

Ing. Martin Martinák, konateľ

zastúpený:

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Rambala , riaditeľ oblasti STRED

Ing. Tibor Kajánek, vedúci PJ Čadca

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Tibor Kajánek, vedúci PJ Čadca

Ing. Peter Krebes , stavbyvedúci

vo veciach ekonomických oprávnený ku konaniu: Mgr. Lenka Líšková, ekonómka PJ Čadca

lenka.liskova@strabag.com

stavbyvedúci:

Ing. Peter Krebes , stavbyvedúci

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

telefón: +421 911 590 081 Ing. Tibor Kajánek

e-mail: tibor.kajanek@strabag.com

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536

a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatel'om podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, túto Zmluvu o Dielo (ďalej len „zmluva“) za nasledovných podmienok:

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková**“ (ďalej aj len ako „**Dielo**“), a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy, ako aj stavebným povolením, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez ďalšieho na základe tejto zmluvy zhotoviť v prospech objednávateľa Dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách. Termíny zhotovenia Diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá za plnenie Diela v plnej miere zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je: **Mostný objekt M4135** – most nachádzajúci sa za obcou Horná Mariková.

Článok III. Cena Diela

1. Cena Diela v celom rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán

v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena Diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností, v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Celková cena Diela je zmluvnými stranami dojednaná vo výške **384 624,35 € Eur (slovom: tristoosemdesiatštyritisícšesťstodvadsaťštyri Eur a tridsaťpäť centov) bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu **473 087,95 Eur (slovom: štyristosedemdesiatštyritisícosemdesiatšesť Eur a deväťdesiatpäť centov)**, sadzba DPH je 23%, čo predstavuje sumu 88 463,60 Eur.
3. Cena Diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer. Cena Diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania, vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii Diela.

Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa článku I. tejto zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. ods. 1 zmluvy.
2. Za riadne zhotovenie Diela v zmysle predchádzajúceho odseku sa považuje riadne vykonanie všetkých stavebných a iných prác a dodávok podľa tejto zmluvy vrátane zabezpečenia vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Právoplatnosťou kolaudačného rozhodnutia sa Dielo považuje za zhotovené.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že termín zhotovenia Diela bol dohodnutý s prihliadnutím na možné prestoje z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok alebo iných krátkodobých okolností, ktoré by mohli ovplyvniť realizáciu Diela, nemôžu mať však vplyv na celkovú lehotu dokončenia Diela.
4. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu, ktorý zmluvné strany nemohli predvídať alebo ovplyvniť (vyššia moc), si zmluvné strany dohodnú nový termín zhotovenia Diela, a to písomným dodatkom k tejto zmluve. Ak k podpisu takéhoto dodatku nedôjde, má sa za to, že platí termín zhotovenia Diela dohodnutý v tejto Zmluve a zhotoviteľ je povinný Dielo v tomto termíne ukončiť a odovzdať.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

6. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu Diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok V. Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto zmluvy bude poskytnutý druhej zmluvnej strane bezodkladne po určení takýchto osôb, v nasledovnom zložení:
 - a) za objednávateľa: stavebný dozor Ing. Peter Ševčík
 - b) za zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. Peter Krebes
2. V prípade zmeny osoby na pozíciách určených v bode 1. písm. a) a b) tohto článku zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od vykonania zmeny, upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vykonaní zmeny a oznámiť druhej zmluvnej strane novú osobu určenú na výkon pozície.

Článok VI. Podmienky zhotovenia Diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu Diela, na základe výzvy na prevzatie staveniska zaslanej objednávateľom zhotoviteľovi (ďalej aj len ako „výzva“), v termíne určenom na prevzatie podľa výzvy. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne uvedenom vo výzve, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v prípade omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 3 dni vo výške 0,1% denne z ceny Diela do prevzatia staveniska a právo odstúpiť od tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie Diela, t.j. od odovzdania staveniska až do úplného zhotovenia a odovzdania Diela.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom aj odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na Diele požiadať správcov, prípadne vlastníkov sietí o vytýčenie existujúcich sietí a káblov (SPP, SSE, Slovak Telekom, StVS, a pod.), aby počas realizácie prác nedošlo k ich poškodeniu. V súlade s predchádzajúcou vetou je zhotoviteľ povinný realizovať zemné práce pri styku s podzemnými inžinierskymi sieťami výlučne ručne.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na

majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávatelom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

6. Počas realizácie Diela je zhotoviteľ povinný dodržať všetky príslušné platné normy, technologické a bezpečnostné predpisy a postupy.
7. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene Diela. Všetky úkony v súvislosti s likvidáciou odpadu hradí zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
9. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác požiadať príslušný správny orgán na úseku dopravy a pozemných komunikácií o určenie a povolenie rozmiestnenia dočasného dopravného značenia a o čiastočnú uzávierku cesty č. III/1976. Umiestnenie a udržiavanie tohto dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác, v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela.
11. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
12. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávatel'a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
13. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávatel', stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.
14. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávatel' alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
15. Poverený zástupca objednávatel'a je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
16. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávatel'a na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak

zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.

17. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
18. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
19. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa. Predovšetkým, ale nie výlučne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich objednávateľovi ako stavebníkovi z § 3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006, k čomu mu udeľuje objednávateľ poverenie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr však v deň zahájenia realizácie Diela) informovať objednávateľa o osobe, ktorú poveril výkonom funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle § 3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote 3 pracovných dní) informovať objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.
20. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
21. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
22. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie Diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

23. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
24. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
25. Objednávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
26. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
27. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie Diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.
28. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie Diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
29. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
30. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
31. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatíu Diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
32. Pre odovzdanie predmetu zmluvy/Diela platí:
- Zmluvné strany pristúpia k odovzdaniu a prevzatíu Diela potom, ako zhotoviteľ riadne vykoná všetky stavebné a iné práce a dodávky podľa tejto zmluvy,
 - Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, pričom platí, že ak lehota nebude v protokole uvedená, Zmluvné strany si dohodli lehotu 15 dní, povinnosť zhotoviteľa následne zabezpečiť vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia/í povoliujúceho užívanie Diela, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,

33. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach všetky dokumenty nevyhnutné k riadnemu užívaniu a prevádzke Diela.
34. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
35. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.

Článok VII. Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ je oprávnený uskutočňovať Dielo prostredníctvom subdodávateľov za podmienok uvedených v tomto článku zmluvy. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy.
2. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu ods. 1 tohto článku zmluvy.
5. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VIII. Platobné podmienky

1. Cena podľa článku III. tejto zmluvy bude fakturovaná mesačnými faktúrami za jednotlivé časti Diela samostatne, pričom faktúra(y) bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru(y) najneskôr do piatich dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Posledná faktúra bude vystavená v minimálnej výške 10% z celkovej ceny Diela, a to po odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do vždy 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa daný Súpis vykonaných prác vyhotovuje. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením doplneného/prepracovaného dokladu objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy zriadiť v prospech objednávateľa zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „**Zábezpeka**“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo Zábezpeky svoje nároky z väd Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bola dohodnutá vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH a zhotoviteľ je povinný ju zložiť na účet objednávateľa SK28 8180 0000 0070 0057 4743 pred podpisom tejto zmluvy. Neposkytnutie Zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť, resp. nepristúpiť k podpisu zmluvy. Zábezpeka podľa tohto bodu bude v nepoužitej časti vrátená zhotoviteľovi do 10 pracovných dní po odovzdaní Diela, nie však skôr ako zhotoviteľ zriadi v prospech objednávateľa garančnú zábezpeku podľa bodu 5 tohto článku zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení garančnej zábezpeky vo výške 5% z celkovej ceny Diela

bez DPH za zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa počas záručnej doby, a to vo forme bankovej záruky (ďalej len „**Banková záruka**“). Zhotoviteľ je povinný Bankovú záruku zriadiť v prospech

objednávateľa pred odovzdaním Diela vo výške 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celého trvania záručnej doby a musí slúžiť na uspokojenie všetkých záväzkov zhotoviteľa, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením zo Zmluvy počas záručnej doby v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zriadiť Bankovú záruku objednávateľovi preukázať potvrdením banky o zriadení bankovej záruky, z ktorého budú vyplývať konkrétne podmienky zriadenia a plnenia z bankovej záruky. Samostatnou písomnou dohodou sa zmluvné strany môžu dohodnúť aj na inej forme zabezpečenia podľa tohto bodu zmluvy.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia Diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia Diela. Záručná doba uvedená v prvej vete sa predlžuje o dvanásť (12) kalendárnych mesiacov v prípade, ak sa vyskytne akákoľvek vada na Diele v poslednom roku jej trvania a/alebo aj sa počas záručnej doby uvedenej v prvej vete opakovane vyskytne rovnaký druh vady.
4. Záruka sa vzťahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby Diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia Diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného Diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa, alebo od zmluvy odstúpiť.

Článok X. Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinností podľa článku IV. ods. 1 tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny Diela s DPH, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinností.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktorejkoľvek z povinností definovaných v článku IX. ods. 5 tejto zmluvy, má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur), a to za každý deň omeškania so splnením každej tejto povinností.
3. V prípade, že je objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela vrátane DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
5. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto článku dotknuté.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodržaním termínu riadneho zhotovenia a odovzdania Diela stanoveného v článku IV. ods. 1 tejto zmluvy, ak takéto omeškanie vzniklo v dôsledku prieťahov prieťahmi v kolaudačnom konaní zo strany príslušného správneho orgánu, ktoré neboli zavinené zo strany zhotoviteľa.

Článok XI. Odstúpenie od Zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávatel'a prijateľné.
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky

zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie Diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné Zmluvy podľa článku VI. ods. 2 tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa článku VIII. ods. 4 tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom,
 - ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením akejkoľvek etapy Diela podľa stanoveného Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
 - ak Zhotoviteľ mešká s odovzdaním Diela v lehote podľa článku IV. odsek 1 zmluvy
 - ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy (ako tie čo sú uvedené vyššie v tomto odseku) a toto porušenie neodstráni ani do 15 dní potom, čo ho objednávateľ na toto odstránenie vyzval resp. v tejto lehote neodstráni negatívne následky tohto porušenia.

Článok XII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, príp. dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
2. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prerušenia alebo zastavenia prác z akýchkoľvek dôvodov (okrem dôvodov podľa ods. 1 tohto článku zmluvy), nemá zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na úhradu nákladov počas doby prerušenia alebo zastavenia prác.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými

zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Zrušenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatie zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátane nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Počítanie lehôt

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť,

od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej

zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia moc

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu,

najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní

ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

Nadpisy

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik Zmluvy

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Započítanie

Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

Zmluvná pokuta

Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Zmeny právneho poriadku

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Prechod práv a povinností

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

Interpretácia

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo

neplatnosti.

Platnosť a účinnosť

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Platnosť uvedených údajov

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia Zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Voľba práva a právomoci

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.


Súčasti Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1 – Harmonogram prác
- Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet
- Príloha č. 3 – Identifikácia projektovej dokumentácie
- Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5 – Stavebné povolenie

V Trenčíne, dňa 2025
08.12.2025

Za objednávateľa:




Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

V Žiline, dňa 13.11. 2025

Za zhotoviteľa – STRABAG s.r.o.:


STRABAG




Ing. Jozef Rambala
riaditeľ oblasti STRED
na základe plnej moci



Ing. Ľubor Kajánek
vedúci PJ Čadca
na základe plnej moci

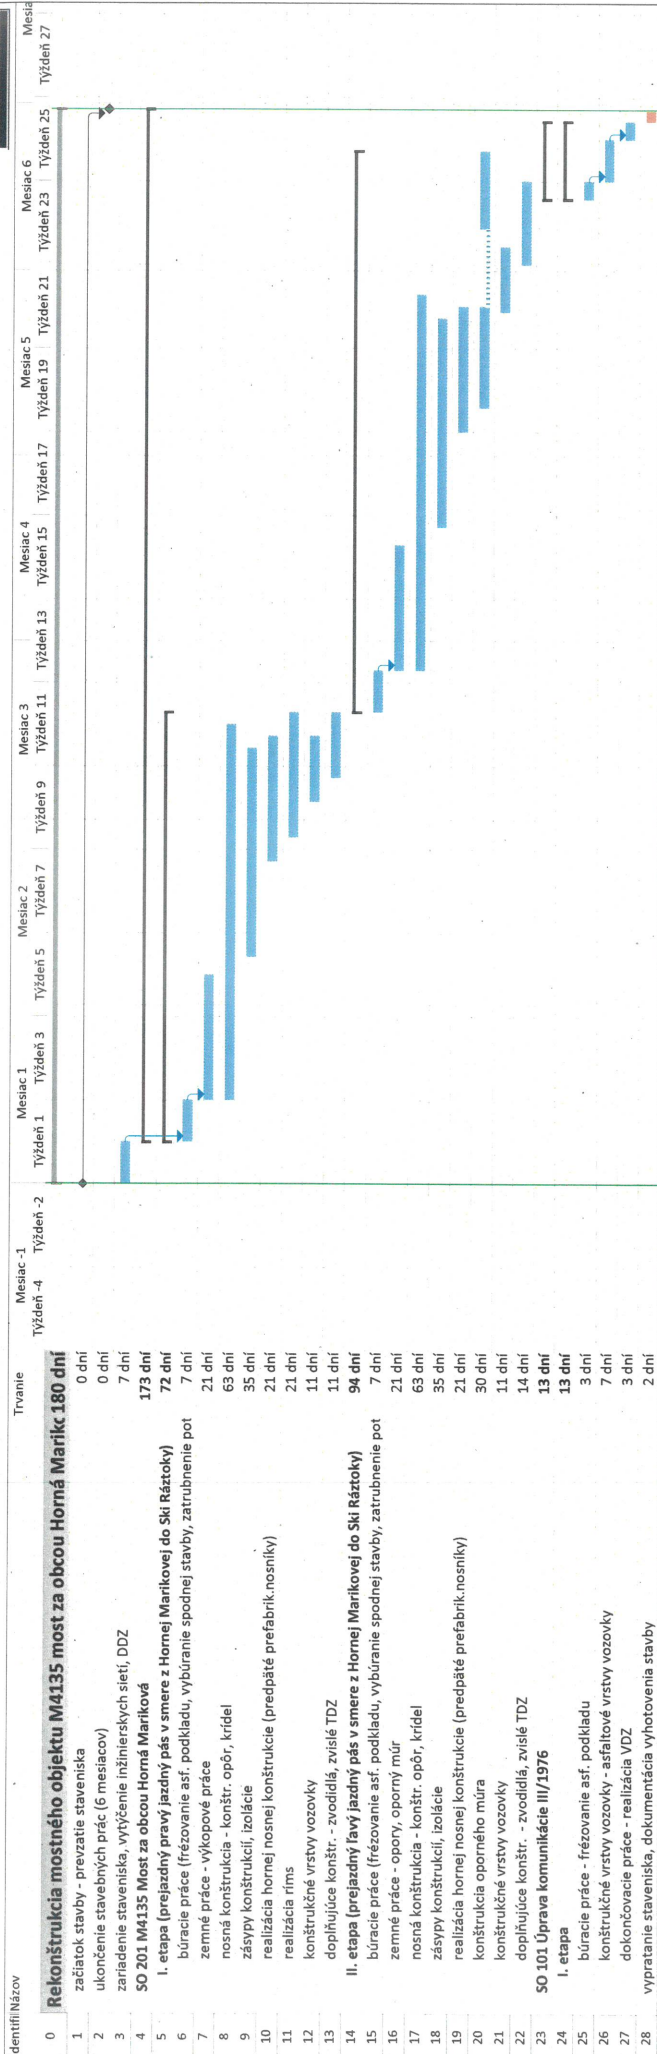

Príloha č. 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Správa ciest TSK	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		15.10.2025	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	384 624,35	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		384 624,35	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		384 624,35
Dátum a podpis		Pečiatka		24	23,0 %	384 624,35 DPH	88 463,60
Objednávateľ				25	%	DPH	
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		473 087,95
Dátum a popis		Pečiatka		E		Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková
Objekt:
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Správa ciest TSK
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 15.10.2025

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Rekonštrukcia mostov II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Horná Mariková	384 624,35
SO 201 - M4135 Most za obcou Horná Mariková	321 649,03
SO 101 - Úprava komunikácie III/1976	62 975,32

<u>Celkom</u>	<u>384 624,35</u>
---------------	-------------------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Správa ciest TSK
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 15.10.2025

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rekonštrukcia mostov II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Horná Mariková				384 624,35	
				SO 201 - M4135 Most za obcou Horná Mariková				321 649,03	
				Zemné práce				21 357,40	
				Prípravné práce				8 222,40	
1			01010401040020.	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	180,000	45,68	8 222,40	23,0
				Hlbéné vykopávky				6 026,63	
2			01030102010210.	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 1 - 2	m3	533,330	11,30	6 026,63	23,0
				Konštrukcie z hornín				5 829,59	
3			01040100070020.	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	318,770	0,55	175,32	23,0
4			01040100090002.	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	573,790	7,21	4 137,03	23,0
5			01040402070210.	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 1 - 2	m3	214,560	5,82	1 248,74	23,0
6			01040702070310.	Uloženie netried. sypanín z hornín 1 až 4, bez zhutnenia s prímiesou ílovej hliny do 20 % objemu	m3	25,070	10,71	268,50	23,0
				Premiestnenie				1 278,27	
7			01060202011020.	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	318,770	4,01	1 278,27	23,0
				Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí				0,51	
8			01070104020110.	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	51,100	0,01	0,51	23,0
				Práce špeciálneho zakladania a konštrukcií				3 041,21	
				Zlepšovacie základovej pôdy				2 147,57	
9			02010221000010.	Lôžko pre tratívd z betónu prostého	m3	13,460	136,75	1 840,66	23,0
10			02010308060010.	Tratívd z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	72,900	4,21	306,91	23,0
				Spevňovanie hornín a konštrukcií				893,64	
11			02060905010010.	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	48,500	1,82	88,27	23,0
12			693310000300.S	Drenážny geokompozit HDPE geosieť s PP jednostrannou geotextiliou, 50x2 m	m2	49,470	16,28	805,37	23,0
				Búracie práce a demolácie				27 396,17	
				Búranie konštrukcií				13 869,27	
13			05010102002200.	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa - 2,49000t	m3	214,170	46,00	9 851,82	23,0
14			05010105002200.	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	33,980	71,10	2 415,98	23,0
15			05010407000110.	Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive betónovom alebo kamenom hm. nad 55 kg/m, -1,25000t	t	8,930	123,55	1 103,30	23,0
16			05010507002200.	Demontáž plechových podláh s odsunom materiálu mimo objektu mosta, -0,06010t	m2	-105,100	4,74	498,17	23,0
				Vybúranie konštrukcií a demontáže				105,28	
17			05020907002270.	Odstánenie zvodičového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, - 0,05400t	m	28,000	3,76	105,28	23,0
				Doprava vybraných hmôt				13 018,32	
18			05080200020010.	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	653,530	12,20	7 973,07	23,0
19			05080290001700.	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	653,530	0,19	124,17	23,0
20			05080900000012.	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	653,530	7,53	4 921,08	23,0
				Doplňujúce práce				368,09	
21			05090362063120.	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	78,820	4,67	368,09	23,0
				Presun hmôt				35,21	
22			05990506011010.	Presun hmôt (05) demolácie stavieb (objektov) výšky do 24 m	t	1,900	18,53	35,21	23,0
				Betonárske práce				103 712,62	
				Základy				26 574,26	
23			11010102070010.	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	42,870	173,79	7 450,38	23,0
24			11010111010010.	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	39,420	37,68	1 485,35	23,0
25			11010111010020.	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	39,420	13,64	537,69	23,0
26			11010121060010.	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	12,210	1 400,56	17 100,84	23,0
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb				46 380,42	
27			11050202071010.	Mostné opory a ťažné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	72,960	181,22	13 221,81	23,0
28			11050211011010.	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	150,350	37,68	5 665,19	23,0
29			11050211011020.	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	150,350	13,64	2 050,77	23,0
30			11050511010110.	Debnenie bloku ložiska zhotovenie alebo odstránenie	m2	4,400	67,37	296,43	23,0
31			11050221061010.	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	8,340	1 400,56	11 680,67	23,0
32			11050321061010.	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	2,090	1 400,56	2 927,17	23,0
33			11050602081010.	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	15,130	251,02	3 797,93	23,0
34			11050611011010.	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	52,670	51,65	2 720,41	23,0
35			11050611011020.	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	52,670	18,19	958,07	23,0
36			11050621061010.	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,820	1 620,75	2 949,77	23,0
37			11050602901061.	Výplň škár monolitické rímky na cest.mostoch tmelom polyuretanovým, š.škáry do 15mm	m2	1,870	60,00	112,20	23,0
				Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb				28 506,53	
38			11080202081010.	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	58,390	202,26	11 809,96	23,0
39			11080211012030.	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	4,460	51,32	228,89	23,0
40			11080211012230.	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	4,460	18,19	81,13	23,0
41			11080221061030.	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	11,700	1 400,56	16 386,55	23,0
				Stoky				23,05	
42			11100301061520.	Stokové žľaby z betónu tr. C 25/30 v otvorenom výkope dĺžky tetivy nad 500 mm	m3	0,060	384,22	23,05	23,0
				Podkladné konštrukcie				2 228,36	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Správa ciest TSK
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 15.10.2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43			11200101033010.	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	166,420	13,39	2 228,36	23,0
Montáže prefabrikovaných konštrukcií								92 192,49	
Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby								53 329,76	
44			15080202000530.	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	11,000	479,88	5 278,68	23,0
45			593410025940.N	Predpätý mostný prefabrikát pre cestné mosty prierezu v tvare obráteného „T“ dĺžky 13390 mm pre doskové mosty	ks	11,000	4 368,28	48 051,08	23,0
Múry								38 786,88	
46			15020602000030.	Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo nad 5000 do 7000 kg	m3	40,560	130,14	5 278,48	23,0
47			593840001300.N	Oporný uholník železobetónový, šírka 1850 mm, výška 2650 mm, hrúbka 350 mm	ks	19,000	1 763,60	33 508,40	23,0
Presun hmôt								75,85	
48			15992100011010.	Presun hmôt (15) pre mosty montované, výška do 20 m	t	4,900	15,48	75,85	23,0
Špeciálne práce pri výstavbe mostov								52 131,98	
Vodorovné nosné konštrukcie								6 912,63	
49.			21080407010110.	Osadenie mostného ložiska elastomerného zaťaženia do 400 kN	ks	2,000	204,62	409,24	23,0
50			628340000100.N	Mostné ložisko z elastomerových pásov š. 300 mm	m2	8,250	788,29	6 503,39	23,0
Podkladné a vedľajšie konštrukcie								15 346,64	
51			21200116000020.	Výplňové kliny za oporu z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	319,390	45,42	14 506,69	23,0
52			21200242001101.	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	8,010	35,11	281,23	23,0
53			21200316001010.	Podkladová a výplňová vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm	m2	48,500	11,52	558,72	23,0
Doplňujúce konštrukcie								29 750,94	
54			21250106020111.	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou z vodorovných tyčí	m	111,000	225,41	25 020,51	23,0
55			21250422040110.	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	30,850	7,53	232,30	23,0
56			21250424040020.	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"	m	55,150	58,19	3 209,18	23,0
57			21250906000310.	Kotvenie monolitického betónu rímky do mostovky kotvou do vývrtu	ks	39,000	8,26	322,14	23,0
58			311990060000.N	Kotevný prvok pre kotvenie rímky	ks	39,000	24,79	966,81	23,0
Presun hmôt								121,77	
59			21992121011010.	Presun hmôt (21) pre mosty monolitické, špeciálne práce, výška do 20 m	t	811,810	0,15	121,77	23,0
Práce na pozemných komunikáciách a letiskách								8 633,56	
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí								3 301,54	
60			22030330030010.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	228,480	1,08	246,76	23,0
61			22030640013020.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	114,240	12,36	1 412,01	23,0
62			22030744030040.	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 45 mm	m2	114,240	13,91	1 589,08	23,0
63			22030334000110.	Zdršňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2	m2	114,240	0,47	53,69	23,0
Doplňujúce konštrukcie								5 327,60	
64			22250671050110.	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	13,000	4,21	54,73	23,0
65			404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	13,000	0,01	0,13	23,0
66			22250671060010.	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	86,54	346,16	23,0
67			404410000300.S	Výstražná značka, rozmer 1260 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	4,000	83,53	334,12	23,0
68			22250762030010.	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaforami	ks	1,000	42,07	42,07	23,0
69			404420000100.S	LED - diódová prenosná semaforová súprava s priemerom svetiel 200 mm	ks	1,000	0,01	0,01	23,0
70			22250762030110.	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy 12V/170Ah	ks	2,000	11,42	22,84	23,0
71			404490009900.S	Akumulátor 12V 170 Ah s výkonom 1000 A	ks	0,020	1,20	0,02	23,0
72			22250784030310.	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	16,000	4,21	67,36	23,0
73			404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	0,160	0,60	0,10	23,0
74			22250784030410.	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 3 dosky	ks	6,000	4,21	25,26	23,0
75			404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4, REF2, obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom	ks	0,180	0,60	0,11	23,0
76			24CP096	Dočasné plastové zvodidlo	m	106,680	41,57	4 434,69	23,0
Presun hmôt								4,42	
77			22992201001010.	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytím z kameniva	t	27,640	0,16	4,42	23,0
Izolačné práce								10 815,15	
Proti vode a zemnej vlhkosti								10 679,32	
78			61010101010020.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	518,280	1,68	870,71	23,0
79			246170000250.S	Lak asfaltový izolačný, organický	kg	0,390	3 425,35	1 335,89	23,0
80			61010101020010.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	259,140	1,68	435,36	23,0
81			246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,090	3 425,35	308,28	23,0
82			61010103020020.	Zhotovenie zvislej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode gumami natavenými do asfalt. podkladu	m2	75,380	7,81	588,72	23,0
83			628340000600.S	Pás asfaltový SBS dilatčný, hr. 5 mm, š. 500 mm, bezvločkový	m	90,460	16,83	1 522,44	23,0
84			61010104020120.	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažiteľné podklady	m2	77,500	6,58	509,95	23,0
85			61010501011110.	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	135,640	7,19	975,25	23,0
86			245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	67,820	19,23	1 304,18	23,0
87			61010502010110.	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	135,640	8,41	1 140,73	23,0
88			628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridlčným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	155,990	10,82	1 687,81	23,0
Presun hmôt								0,37	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG


Objednávateľ: Správa ciest TSK
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 15.10.2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89			61996101011010.	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	2,340	0,16	0,37	23,0
				Montáž stolárskych konštrukcií				135,46	
90			66070100000011.N	Montáž bŕdky pre vodná potočného drevená	ks	2,000	67,73	135,46	23,0
				Montáž zámočnických konštrukcií				1 193,40	
				Doplňky				1 193,40	
91			67120900000080.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	585,000	2,04	1 193,40	23,0
				Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia				1 175,05	
				Nátery				1 174,76	
92			84010807032111.	Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	m2	61,090	19,23	1 174,76	23,0
				Presun hmôt				0,29	
93			84998401011010.	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	t	1,830	0,16	0,29	23,0
				SO 101 - Úprava komunikácie III/1976				62 975,32	
				Búracie práce a demolácie				3 200,63	
				Doplňujúce práce				3 200,63	
94			05090362073130.	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 200 mm 0,500 t	m2	685,360	4,67	3 200,63	23,0
				Práce na pozemných komunikáciách a letiskách				59 774,69	
				Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva				8 071,68	
95			22010104000200.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	737,140	10,95	8 071,68	23,0
				-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom				16 054,91	
96			22020421021026.	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 230 mm	m2	737,140	21,78	16 054,91	23,0
				Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				35 648,10	
97			22030329030110.	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	737,140	0,61	449,66	23,0
98			22030330010008.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 474,280	0,54	796,11	23,0
99			22030640012440.	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	737,140	18,61	13 718,18	23,0
100			22030640013230.	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	737,140	15,98	11 779,50	23,0
101			22030640042020.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	737,140	12,08	8 904,65	23,0

Celkom

384 624,35

Príloha č. 3

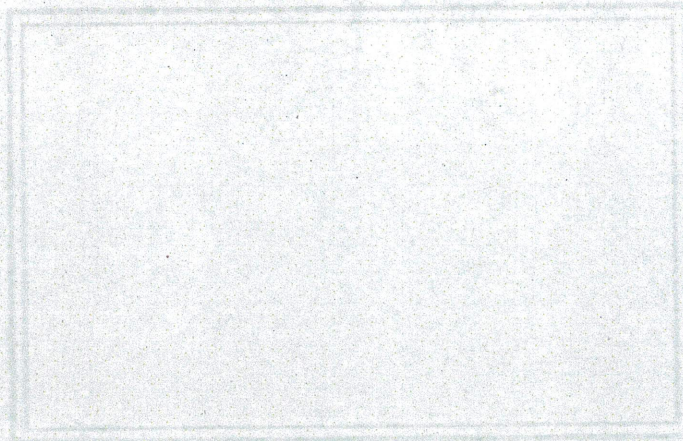

K č. j.: OU-PB-OCDPK-2024/012498-008

Technicky preskúmané, overené a schválené za podmienok predpísaných v stavebnom povolení.

V Považskej Bystrici, dňa 27. novembra 2024

Podpis: _____



NÁZOV A MIESTO STAVBY			OBJEDNÁVATEL	
PD REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU M4135 MOST ZA OBCOU HORNÁ MARIKOVÁ			Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brniarska 3 911 05 Trenčín	
KRAJ TRENČIANSKY	OKRES (OBVOD) STAVBY POVAŽSKÁ BYSTRICA	KATASTRÁLNE ÚZEMIE HORNÁ MARIKOVÁ		
SPRACOVATEL PD d-phase D-Phase, a.s. Mlynské nivy 49 821 09 Bratislava Slovensko IČO: 54 148 855	HL. INŽ. PROJEKTU ING. MICHAL ŠESTÁK	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. JÁN LACO, PhD.		
	VYPRACOVAL KOLEKTÍV			
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE DSPRS	KONTROLOVAL ING. JÁN LACO, PhD.			
ČASŤ			DÁTUM 02.2024	SÚPRAVA 6

Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Obchodné meno uchádzača/skupiny dodávateľov:	Strabag s.r.o.
Sídlo alebo miesto jeho podnikania:	Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:	17317282

Dolu podpísaný zástupca uchádzača predkladajúceho ponuku v postupe zadávania zákazky na predmet zákazky **"Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková"** vyhlásenom verejným obstarávateľom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín (ďalej len „verejné obstarávanie“)

týmto čestne vyhlasujem,

že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet verejného obstarávania:

- ☒ X nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa:	
IČO:	
Predmet subdodávky (podrobný popis činností, ktoré bude realizovať na predmete zákazky)	
Podiel subdodávky v %	
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☐ Nie

V Žiline dňa 13.11. 2025



Ing. Tibor Kájánek
vedúci PJ Čadca
na základe plnej moci



Ing. Jozef Rambala
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

STRABAG
Bratislava
(3)

OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica


Príloha č. 5

Číslo spisu

OU-PB-OCDPK-2024/012498-008

Považská Bystrica

16. 10. 2024



Rozhodnutie

STAVEBNÉ POVOLENIE

Výrok

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 a §16 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), pri použití § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania.

Špeciálny stavebný úrad po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb., § 16 zákona č. 135/1961 Zb. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

Stavebníkovi: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 01 Trenčín

povoľuje uskutočniť stavbu: „PD Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková “ – priestorové usporiadanie mosta je v zmysle STN 73 6201. Ma moste sú vedené dva protismerné jazdné pruhy, vonkajší jazdný pruh je šírky 3,8m a vnútorný pruh v šírke 3,85, voľná šírka mosta je 7,65m. na voľných okrajoch mosta sú železobetónové rímky šírky 0,8m. smerovo sa trasa neupravuje vyhotoví sa len plynulý nábeh krajov vozovky na novo vybudované šírkové usporiadanie mosta. Výškové vedenie trasy pred a za mostom sa upraví. Mostný otvor po rekonštrukcii je postačujúci pre zabezpečenie bezprekážkového prietoku Marikovského potoka. Vo fáze výstavby budú na pripravený úložný prah osadené predpäté prefabrikované nosníky na pružnú podložku. Montážna /projektovaná poloha nosníkov bude zabezpečená oceľovým trňmi priemeru 25mm (v nosníkoch bude vopred pripravená diera pre trň. Otvor v nosníku sa po osadení nosníka vyplní zálievkovou maltou s rýchlym nástupom pevnosti. Vo fáze výstavby budú nosníky slúžiť ako stratené debnenie pre betonáž rámových rohov a spriahajúcej dosky hr. 125mm. Po zmonolitnení bude konštrukcia mosta pôsobiť ako integrovaná rámová konštrukcia s oddielovanými krídlami. Rám konštrukcie vytvárajú dve opory hrúbky 1200mm na základoch pásoch a nosná doska s konečnou hrúbkou 700mm (prefabrikované nosníky 575mm + 125mm spriahujúca doska). Spriahujúca doska je so spodnou stavbou prepojená tuho, vystuženými rámovými rohmi.

Horná hrana dosky má jednostranný priečny sklon 3,2% a je pôdorysne zošíkmená podľa šikmosti mosta. V mieste ríms má doska sklon smerom k osi odvodnenia 3,2%. nosná doska má dĺžku 14,9m, šírku v smere kolmom 9,7m. Súčasťou rámovej konštrukcie sú dve opory, uložené na základových pásoch. Oporné steny sú po výške konštantnej hrúbky 1200mm. Rámový most je založený na železobetónových základových pásoch šírky 2200mm a výšky 500mm. Horná hrana základového pásu je v sklone 7% od líca steny.

Krídla sú vyhotovené ako oporné múry. Stena krídel je od opôr oddelená tesnenou dilatačnou škárou. Samotná dilatačná škára je vyplnená pružným materiálom z XPS. Na líci múru sa škára prekryje predtesnením a tesniacim

elastickými tmelom. Krídla sú hrúbky 400mm. Šírka základu krídel je 2,200m. Základ krídiel je prepojený so základom opory rámovej konštrukcie.

Povrchy konštrukcie spodnej stavby v styku so zeminou sa opatria penetračným náterom, na ktorý sa následne aplikuje celoplošná izolácia z natavovaných izolačných pásov a plošná drenáž.

Na rube opôr a krídel sa vytvorí drenáž na podkladanom betóne. Drenáž bude vyhotovená v obojstrannom sklone k osi mosta a vyústená cez opory priamo do koryta vodného toku. Vyústenie rubovej drenáže musí byť vo výške minimálne 100mm nad hranou koryta v mieste steny a musí sa prispôbiť spádu koryta v pozdĺžnom smere toku. Dĺžka vyústenia drenáže za oporou je 100mm od líca múru.

Povrchová zrážková voda z vozovky bude odvádzaná jednostranným sklonom 3,2% k zvýšeným obrubám nepochôdznych ríms a pozdĺž obruby k prechodovej oblasti mosta v pozdĺžnom sklone 2,33% v smere na Hornú Marikovu. Prípadne priesaky cez asfaltovú vozovku budú odvedené z povrchu izolácie pozdĺžnym drenážnym kanálikom z drenážneho plastbetónu 8/16 š. 100mm.

Odvodnenie povrchu vozovky za oporným múrom bude realizované strechovitým sklonom k zvýšeným obrubám nepochôdznych ríms. V rímach budú vynechané otvory pre osadenie betónových žľabov, ktoré budú slúžiť pre odvedenie dažďovej vody do koryta Marikovského potoka.

na pozemku parcelné číslo: KN C č. 1772/2, 2221/1, 2048/3, 1340, 2352/1 v k.ú. Horná Mariková

dokumentáciu vyhotovil: D-Phase a.s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Pre uskutočnenie stavby sa určujú záväzné podmienky:

1. Stavba sa uskutoční podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je podkladom pre toto rozhodnutie a jej jedna sada je uložená u povoľujúceho orgánu.
2. Prípadné zmeny, ktoré sa v priebehu výstavby vyskytnú ako nevyhnutné a odlišujú sa od schválenej PD, stavebník včas prerokuje a požiada špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb..
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať:
 - platné technické normy a technologické predpisy,
 - platné predpisy na ochranu verejných záujmov a životného prostredia,
 - platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
4. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu.
5. Stavebník bude stavbu realizovať v lehote 12 mesiacov a po ukončení stavby požiada špeciálny stavebný úrad o zvolanie kolaudačného konania.
6. Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom - zhotoviteľ stavby bude vybraný verejnou súťažou.
7. Odborný dozor na stavbe bude vybraný verejnou súťažou. Štátny stavebný dohľad budú vykonávať pracovníci špeciálneho stavebného úradu Ing. Gabriela Rezáková a Ing. Nikola Baculíková.
8. Funkcie stavebného dozoru a stavbyvedúceho musia vykonávať odborne spôsobilé osoby v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení zákona č. 236/2000 Z. z..
9. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy podľa vytyčovacích výkresov, orgánom alebo organizáciou na to oprávnenou alebo zodpovedným geodetom.
10. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona, ktoré majú osvedčenie o akosti. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii podľa zákona č. 133/2013 Z. z..

11. Pred začatím prác, stavebník zabezpečí vytyčenie všetkých inžinierskych sietí za účasti ich majetkových správcov.

12. Stavebník dodrží požiadavky jemu dané v rozhodnutiach o ochrane telekomunikačných zariadení podľa zákona č. 452/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13. Stavebník dodrží požiadavky dotknutých orgánov a organizácií uplatnené v stavebnom konaní, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov a to najmä;

a) Záväzne stanovisko Obce Horná Mariková, Obecný úrad 357, 018 03 Horná Mariková pre vydanie stavebného povolenia podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. pre špeciálne stavebné úrady vydané pod č.: 04-023/2024 zo dňa 28.08.2024.

b) Stanovisko Obce Horná Mariková, Obecný úrad 357, 018 03 Horná Mariková č. 04-023/2024 zo dňa 03.06.2024. Obec požaduje počas realizácie prác zjazdnosť cesty minimálne v polovičnom profile, vzhľadom k tomu, že je to jediná prístupová cesta do vyššie položených častí obce, žijú tam trvale prihlásení občania a nachádza sa tam množstvo rekreačných objektov. Tak isto v tomto úseku premáva autobusová linka.

c) Vyjadrenie Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612411578 zo dňa 22.04.2024:

- Exitujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné čísla v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia Sek prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete (Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398).
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona, a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť uložením vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

d) Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, č. 2024404-SP-0330-1 zo dňa 30.04.2024

- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2021 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušené vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenia a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1meter od krajného vodiča NN vzdušeného vedenia na každú stranu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ak aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

e) Závazné stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica č. OU-PB-OSZP-2024/010904-002 zo dňa 12.08.2024 :

- Stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie „PD rekonštrukcia mostného objektu M4135 most za obcou Horná Mariková“, ktorú vypracoval Ing. Ján Laco, PhD. V 02/2024. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu mostného objektu zbúraním pôvodnej konštrukcie mosta a náhradou novou konštrukciou mosta a príslušného oporného múru vrátane výškového napojenia na jestvujúcu cestu pred a za mostom. Mostný objekt sa nachádza na komunikácii III/1976 v staničení 15,464 km ponad Marikovský potok v obci Horná Mariková, v smere Horná Mariková (centrum obce) – Ski Ráztoka. Dĺžka mosta predstavuje 21,326 m. Súčasťou projektovej dokumentácie sú hydrotechnické výpočty.
- Pri stavebných prácach ako i počas užívania stavby dodržiavať ochranné opatrenia, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy
- Počas stavebných prác koryto vodného toku udržiavať v čistom stave. Ukladať predmety do vodného toku, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané.
- V prípade poškodenia brehov alebo dna vodného toku je potrebné ich uviesť do pôvodného stavu.
- Dodržať podmienky určené správcom vodného toku – Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Povodie horného Váhu, o.z., ktoré sú uvedené v stanovisku č. SVP 11670/2024/2 zo dňa 04.06.2024, okrem iného:
 - i. Lavostranné nátokové krídlo mostnej opory vybudovať z lomového kameňa založeného o kamennú pätku na dĺžku 2,0m .
 - ii. Pravostranné výtokové krídlo mostnej opory vybudovať z lomového kameňa založené o kamennú pätku na dĺžku 2,0m.
 - iii. Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s vybudovaním oporného múru, mostných opôr a podpernej konštrukcie mostovky je potrebné uskutočniť v čase zníženia prietokov.
 - iv. Nakoľko budú stavebné práce vykonávané stroje, stavebník je povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcimi technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými opatreniami a prostriedkami. V prípade úniku nebezpečných látok do toku neodkladne informovať SIŽP a správcu predmetného toku.
 - v. Ukladať stavebný materiál a odpad v ochrannom pásme vodného toku je zakázané.
 - vi. So vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
 - vii. Okolie vodného toku a jeho ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušené opevnenie opraviť. Ku kontrole prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi.
 - viii. V zmysle §10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ste povinný spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a ešte pre jeho schválením príslušným orgánom ochrany pred povodňami ho odsúhlasiť s našou organizáciou – Ing. Kukla Marián, tel. +421/445234128, kukla.marian@svp.sk
 - ix. Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.
 - x. Po ukončení stavby, žiada správa tokov v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesto križovania toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správu povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk
 - xi. Vlastníctvo a správu mosta spolu s oporným múrom bude majiteľ vykonávať v zmysle ustanovení §47 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, dbať o jeho riadnu údržbu, prietoknosť a statickú bezpečnosť.
 - xii. Podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a jeho novelizácií a v zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku na vzdialenosť min. 6,00m od jestvujúcej brehovej čiary po oboch stranách toku. Uvedené ochranné pásmo tokov slúži podľa §49 vodného zákona správcovi toku k výkonu jeho správy.
 - xiii. Zahájenie a ukončenie stavebných prác nahlásiť úsekovému technikovi Ing. Ján Ďurech 0903 572 606.
 - xiv. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ťadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa §49 ods. 5 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - xv. Stanovisko správcu tokov, nenahrádza stanoviská vlastníkov pozemkov.

- Udržiavať stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku.
- Súhlas vydaný orgánom štátnej vodnej správy nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu. Podľa §73 ods. 18 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy je dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad. Súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa §27 ods. 1 písm. a) až d) tohto zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

f) Záväzné stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-PB-OSZP-2024/008631-002 zo dňa 26.06.2024:

- S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
- Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo inými nežiaducim únikom.
- Pôvodca odpadu je podľa §77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch povinný pri stavbách nad 300m² zastavanej ploche zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov limitov zhodnocovania recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch.
- Pôvodca odpadu je podľa §77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch povinný stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
- Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odami podľa §14 ods. 4 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa §77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa §14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvoreným minimálne v rozsahu určenom v §2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.
- Podľa §77 ods. 4 zákona o odpadoch je pôvodca odpadu povinný stavebné odpady vzniknuté pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcií alebo demolácií komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcií alebo údržbe komunikácií.
- Výkopovú zeminu (zaradenú pod katalógové číslo 17 05 06 podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov) je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú zeminu je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebníka zároveň upozorňujeme, že na skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska sa vyžaduje súhlas podľa §97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch, ktorý pre pôvodcu odpadu udeľuje okresný úrad v sídle kraja t.j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v §26 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné ich zhromažďovať oddelene a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Pôvodca odpadu je podľa §77 ods. 3 písm. e) zákona o odpadoch povinný v prípade realizácie demolačných (búracích) prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spôsob selektívnej demolácie obsahujúcich aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom podľa §8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácie na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky vrátane fotodokumentácie.
- O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa §2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- Vzniknuté odpady je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa §3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- Stavebník je povinný podľa §99 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, projektovú dokumentáciu stavby a uviesť zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli, uviesť ich množstvá a spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklady o zabezpečení

zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu, resp. jeho zneškodnenia oprávnenou osobou (objednávka, zmluva, faktúra, vážne lístky).

- Podľa §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzickú osobu je pôvodcom odpadov ten kto uvedené práce vykonáva.
- Predmetné vyjadrenie sa podľa §99 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely stavebného konania.

g) Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. , Povodie horného Váhu, č. SVP 11670/2024/2 zo dňa 01.07.2024:

- Ľavostranné nátokové krídlo mostnej opory vybudovať z lomového kameňa založeného o kamennú pätku na dĺžku 2,0m .
- Pravostranné výtokové krídlo mostnej opory vybudovať z lomového kameňa založené o kamennú pätku na dĺžku 2,0m.
- Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s vybudovaním oporného múru, mostných opôr a podpernej konštrukcie mostovky je potrebné uskutočniť v čase zníženia prietokov.
- Nakoľko budú stavebné práce vykonávané stroje, stavebník je povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcimi technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými opatreniami a prostriedkami. V prípade úniku nebezpečných látok do toku neodkladne informovať SIŽP a správcu predmetného toku.
- Ukladať stavebný materiál a odpad v ochrannom pásme vodného toku je zakázané.
- So vzniknutým odpadom nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- Okolie vodného toku a jeho ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušené opevnenie opraviť. Ku kontrole prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi.
- V zmysle §10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ste povinný spracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a ešte pre jeho schválením príslušným orgánom ochrany pred povodňami ho odsúhlasiť s našou organizáciou – Ing. Kukla Marián, tel. +421/445234128, kukla.marian@svp.sk
- Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.
- Po ukončení stavby, žiada správa tokov v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesto križovania toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na Správu povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk
- Vlastníctvo a správu mosta spolu s oporným múrom bude majiteľ vykonávať v zmysle ustanovení §47 vodného zákona č. 364/2024 Z. z. v znení neskorších predpisov, dbať o jeho riadnu údržbu, prietočnosť a statickú bezpečnosť.
- Podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a jeho novelizácii a v zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku na vzdialenosť min. 6,00m od jestvujúcej brehovej čiary po oboch stranách toku. Uvedené ochranné pásmo tokov slúži podľa §49 vodného zákona správcovi toku k výkonu jeho správy.
- Zahájenie a ukončenie stavebných prác nahlásiť úsekovému technikovi Ing. Ján Ďurech 0903 572 606.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa §49 ods. 5 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Stanovisko správcu tokov, nenahrádza stanoviská vlastníkov pozemkov.

h) Súhlas Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OU-TN-OSZP1-2024/031273-014 zo dňa 28.08.2024 na zmenu stavu mokrade :

- Súhlas sa vydáva a výnimka sa povoľuje len v súvislosti s navrhovanou stavbou: Rekonštrukcia mostného objektu M4135 za obcou Horná Mariková.
- Zmena stavu mokrade bude vykonaná podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú vypracovala spoločnosť D-Phase a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO 54148855 dňa 28.02.2024, kód dokumentu DP202329-A-SSP.
- Pri stavbe budú dodržané podmienky stanovené správcou vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie horného Váhu, Odštepny závod Ružomberok (Ďalej „SVP“) v jeho vyjadrení pre stavebné povolenia zn. SVP 11670/2024/2 z 01.07.2024.
- Ľavostranné nátokové a pravostranné výtokové krídlo mostnej opory bude vybudované z lomového kameňa založené o kamennú pätku na dĺžke 2,0m.

- Stavebné práce v koryte rieky budú vykonávané v období znížených prietokov.
- Pri stavbe budú dodržané podmienky stanovené Štátnou ochranou prírody Správou Chránenej krajinskej oblasti Kysuce (Ďalej „ŠOP“) v ich odbornom stanovisku zn. CHKOKY/278/001/2024/PD z 05.08.2024.
- Pred realizáciou stavby stavebník písomne požiada ŠOP o súčinnosť pri minimalizovaní škôd na chránených živočíchoch v dostatočnom časovom predstihu, to je minimálne 30 dní pred realizáciou stavebných prác.
- Stavebník zabezpečí priechodnosť koryta pre vydru riečnu počas realizácie prác vybudovaním suchej cesty v koryte vodného toku.
- Stavebník umiestni pozdĺž oporného múru na dne koryta pri päte múru kamene v súvislej línii s minimálnou frakciou 50 – 70kg z dôvodu zmiernenia negatívneho vplyvu na biotop brehu.
- V mostnom telese stavebník zabezpečí osadenie dvoch búdok pre vodnára riečného a suchej cesty pre vydru riečnu.
- V súvislosti so stavbou žiadateľ vykoná opatrenia proti šíreniu inváznych druhov rastlín. Zemina, štrkopiesok a výkopový materiál vzniknutý pri terénnych úpravách v bezprostrednom okolí bude použitý na mieste stavby a nebude presúvaný na inú lokalitu; v prípade jeho prebytku bude zlikvidovaný na riadnej skládke odpadu.
- Stavebník v časovom predstihu, minimálne 30 dní, písomne oznámi začatie prác vlastníkovi a správcovi dotknutých pozemkov, so zástupcami obhospodarovateľa lesa uzavrie písomnú dohodu o riešení prejazdu odvozných súprav, ako aj spôsob kompenzácie obmedzenia počas realizácie stavebných prác.
- Stavebník uzavrie písomnú dohodu s vlastníkom (správcom, užívateľom) pozemku mimo spevnenej cesty o zriadení dočasnej obslužnej plochy pre krátkodobé uloženie stavebného materiálu a zriadenie výhybne pre pracovné stroje. Uvedenú plochu stavebník uvedie po ukončení prác do pôvodného stavu pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.
- V prípade nutnosti orezania konárov stromov bude orev vykonaný podľa Slovenskej technickej normy STN 83 7010 pre ošetrovanie, udržiavanie a ochranu stromovej vegetácie.
- Ak bude nevyhnutný výrub drevín, bude tento vykonaný až na základe právoplatného povolenia vydaného príslušným orgánom ochrany prírody. Pokiaľ bude nevynútený výrub drevín na lesnej pôde, stavebník požiada vlastníka (správcu, používateľa) o jeho realizáciu v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Príslušným orgánom štátnej správy je Okresný úrad (ďalej „OÚ“) Považská Bystrica.
- V prípade že bude nutné vykonať pred, počas alebo pri ukončení realizácie prác terénne úpravy, je potrebné pre ich realizáciu požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o záväzné stanovisko podľa §9 ods. 1 písmeno d) zákona. Príslušným orgánom štátnej správy je OÚ Považská Bystrica.
- V súvislosti so stavbou žiadateľ vykoná opatrenia proti úniku ropných látok do vody a do prírodného prostredia.
- Stavebník oznámi písomne začatie stavebných prác najmenej 30 pracovných dní vopred ŠOP a strpí počas stavebných prác prítomnosť zamestnanca ŠOP.
- Stavebník požiada minimálne 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o kolaudáciu stavby orgán ochrany prírody a krajiny a ŠOP o preverenie plnenia podmienok tohto rozhodnutia.

i) Stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny č. OU-PB-OSZP-2024/011979-003 zo dňa 02.10.2024

• Za dodržania podmienok uvedených v rozhodnutí Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-OSZP1-2024/031273-014 zo dňa 28.08.2024 s doložkou právoplatnosti zo dňa 26.09.2024 nemá k predmetnej stavbe pripomienky.

j) Vyjadrenie Považskej vodárenskej spoločnosti a. s., č. 5970/61/2024 zo dňa 15.05.2024 nemá pripomienky k uvedenej stavbe.

k) Vyjadrenie SPP distribúcia a.s., č. TD/NS0384/2024/Gv zo dňa 29.04.2024:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcim plynárenskými zariadeniami a v správe SPP-D.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Kvasnica Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel: č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.Z. Trestný zákon.
- V zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
- V zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

l) Pripomienky Mestských lesov Považská Bystrica s.r.o., č. OP-271-2024 zo dňa 25.09.2024 a OP-248-2024 zo dňa 05.09.2024

- Spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. pri svojej hospodárskej činnosti využíva denne uvedený most a cestu III. triedy na odvoz dreva z odvozných miest z prenajatých pozemkov vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica, nachádzajúcich sa nad plánovanou rekonštrukciou mostného objektu M4135 v obci Horná Mariková, do sídla spoločnosti v Považskom Podhradí. Drevná hmota je odvážaná denne odvoznými súpravami s celkovou povolenou hmotnosťou jazdnej súpravy 40ton. Z tohto dôvodu žiadame o zabezpečenie prejazdu odvozných súprav s celkovou povolenou hmotnosťou jazdnej súpravy 40 ton počas rekonštrukčných prác mostného objektu M4135.
- Spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. žiada, aby bola písomne informovaná mesiac vopred o začiatku plánovanej rekonštrukcie.
- Spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. pri svojej plánovanej hospodárskej činnosti na rok 2025 upozorňuje na fakt, že cca 70% vyťaženej drevnej hmoty plánovanej na rok 2025 musí prepraviť odvoznými súpravami s celkovou povolenou hmotnosťou jazdnej súpravy 40 ton po ceste III. triedy, ktorá vedie cez plánovanú rekonštrukciu mostného objektu M4135 a nie je možné ho prepraviť inou náhradnou trasou.
- V prípade nesplnenia našich požiadaviek týkajúcich sa obmedzenia našej hospodárskej činnosti (odvoz dreva) budeme požadovať finančnú náhradu za obmedzenie hospodárenia na prenajatých pozemkoch vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica.
- Žiadame, aby si zhotoviteľ stavby pred úplnou rekonštrukciou mosta a obmedzením dopravy na moste odsúhlasil so spoločnosťou Mestské lesy Považská Bystrica s.r.o., Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica spôsob organizácie dopravy.

14. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc nebola stavba začatá.

Osobitné podmienky:

- Toto povolenie nadobúda platnosť až po uplynutí 15 dní od jeho doručenia, ak za túto dobu nebude proti nemu podané odvolanie.
- Staveniskom pre realizovanie stavby rozumejú sa pozemky, určené na uskutočnenie stavby.
- V prípade znečistenia, poškodenia cesty, alebo miestnej komunikácie, je stavebník povinný túto uviesť okamžite do pôvodného stavu.
- Stavebník ku kolaudácii predloží geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný oprávnenou osobou.

- e) Stavba po ukončení bude majetkom: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.
- f) Za nesplnenie podmienok rozhodnutia bude stavebník sankcionovaný poplatkami v zmysle § 106 zákona č. 50/1976 Zb..

Za toto povolenie bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vybratý správny poplatok vo výške 600€. (Správny poplatok bol uhradený bankovým prevodom dňa 24.09.2024).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Nevydáva sa, nakoľko neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín v zastúpení spoločnosťou D-Phase a.s., Mlynské nivy 49, 821 05 Bratislava dňa podala 06.09.2024 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavu „PD Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková“. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Tunajší úrad listom č. OU-PB-OCDPK-2024/012498-003 zo dňa 23.09.2024 oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a samosprávy začatie stavebného konania. a súčasne podľa §61 ods. 2 zákon č. 50/1976 Zb. upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť o stavebné povolenie poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

V súlade s ust. § 61 ods. 3 správneho poriadku špeciálny stavebný úrad upozornil účastníkov konania, dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, že môžu svoje námietky a pripomienky k navrhovanej a povoľovanej stavbe uplatniť v určenej lehote do 11.10.2024, inak sa na ne neprihliadne. V uvedenej lehote bolo špeciálnemu stavebnému úradu doručený list od Mestských lesov Považská Bystrica s.r.o., Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica, č. OP-271-2024 zo dňa 25.09.2024 ktorých pripomienky boli zapracované do podmienok na realizáciu stavby.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 zákona č. 50/1976 Zb.. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené § 47 a 48 zákona č. 50/1976 Zb., všeobecným technickým požiadavkám na navrhovanie a uskutočňovanie stavby. V priebehu stavebného konania stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie objektu stavby.

Stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy boli skoordinovalé a zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Mgr. Ján Šamaj
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10121

Doručuje sa

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
D-Phase a.s., Mlynské nivy 49, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Obec Horná Mariková, Modlatín 357, 018 03 Modlatín, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
SAD TRENČÍN, a.s., Zlatovská cesta, 911 37 Trenčín, Slovenská republika
TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Považská Bystrica (OVM), Centrum 2, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o., Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici, ODI, Kukučínova 186, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
O2 Networks, s.r.o., Pribinova 40, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Jana Kuzmová, Ulica Hospodárska 3616/65, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Ing. Martin Šupák, Štúrova 115/15, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Ivan Cabaj, Horná Mariková 587, 018 03 Horná Mariková, Slovenská republika
Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
