

64/4/2024

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

so sídlom : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

IČ DPH : SK2021764767

príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ : DOSA Slovakia, s.r.o.

so sídlom : Predmier 425, 013 51 Predmier

IČO : 36 412 678

IČ DPH : SK2020109443

bankové spojenie : VÚB Banka a.s.

IBAN : SK18 0200 0000 0039 0301 3455

konajúca prostredníctvom: Ing. Juraj Kurtulík, Ing. Marek Kocian - konatelia

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatel'om podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, túto Zmluvu o Dielo (ďalej len „**zmluva**“) za nasledovných podmienok:

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo k zákazke „**Rekonštrukcia mostného objektu M6308 most cez Brodziansky potok v obci Brodzany**“ (ďalej aj len ako „**Dielo**“), a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a jej prílohách.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúkanej cene, vrátane zabezpečenia kolaudácie stavby.
3. Dielo zahŕňa komplexnú rekonštrukciu mostného objektu M6308 na ceste II/593 s dĺžkou premostenia 3,9m. Práce spočívajú najmä, nie však výlučne v odbúrání nosnej konštrukcie, úložných prahov, opevnenia brehov a dna pod mostom, následne z úpravy spodnej stavby dobetonávkami v okolí krídel a základov tak, aby bolo možné osadiť novú nosnú konštrukciu, ktorá bude tvorená oceľovým profilom typu tubosider a bude mať tvar polkruhu s rozpätím 3,75m a vzopätím 1,8m. Po osadení konštrukcie a doplnení požadovaného obsypu dôjde dobudovaniu mostného zvršku a bezpečnostných zariadení. Súčasťou úprav je aj vystuženie ľavého svahu v dĺžke cca 20,0m pred mostom a 20m za mostom osadením výstužných blokov tvorených z dvojzákrutovej oceľovej siete. Lícna časť blokov bude vysypaná kamenivom. V rámci stavby bude realizovaná rekonštrukcia vodovodného potrubia na dĺžke 25,0m . Staré potrubie bude nahradené novým HDPE potrubím DN200mm, bude vybudovaná zhybka popod potok s oceľovou chráničkou DN300mm a novým kalníkom, pričom je k tomuto kroku nutné vypracovať dokumentáciu (DVP v podrobnosti DRS) a nechať si ju schváliť u Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá za plnenie Diela v plnej miere zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je obec Brodzany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.

Článok III. Cena Diela

1. Cena Diela v celom rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena Diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností, v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto

zmluve.

2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo 439 990,00 € **bez DPH** (slovom: štyristotridsaťdeväťtisíc deväťstodeväťdesiat eur bez DPH). Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 541 187,70 € (slovom: päťstoštyridsaťjedentisíc stoosemdesiaty sedem eur a 70 centov s DPH), sadzba DPH je 23%, čo predstavuje sumu 101 197,70 €.
3. Cena Diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Cena Diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, správne poplatky, vytýčenie inžinierskych sietí, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania, vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dôjde k prerušeniu prác bez ohľadu na to, z akého dôvodu k prerušeniu došlo, nemá Zhotoviteľ nárok na úhradu žiadnych nákladov či škody vzniknutých v dôsledku tohto prerušenia, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa článku I. tejto zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote 4 mesiace odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. ods. 1 zmluvy.
2. Riadnym zhotovením diela sa rozumie vykonanie všetkých stavebných a iných prác a dodávok podľa tejto zmluvy a jej príloh, následne riadne odovzdanie Diela v súlade s čl. VI. bod 23 zmluvy a podanie návrhu na kolaudáciu stavby v súlade s čl. VI. bod 27 zmluvy.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že termín zhotovenia Diela bol dohodnutý s prihliadnutím na možné prestoje z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok alebo iných krátkodobých okolností, ktoré by mohli realizáciu Diela ovplyvniť.
4. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu, ktorý zmluvné strany nemohli predvídať alebo ovplyvniť (vyššia moc), si zmluvné strany dohodnú nový termín zhotovenia Diela, a to písomným dodatkom k tejto zmluve. Ak k podpisu takéhoto dodatku nedôjde, má sa za to, že platí termín zhotovenia Diela dohodnutý v tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný Dielo v tomto termíne ukončiť a odovzdať.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené.
6. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu Diela vrátane prípadného prerušenia prác v súlade s týmto článkom zmluvy. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, nemôže sa domáhať v súvislosti s prerušením prác akýchkoľvek nárokov alebo vyvodzovať v prospech seba akékoľvek dôsledky.

Článok V.

Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto zmluvy bude poskytnutý druhej zmluvnej strane bezodkladne po určení takýchto osôb, v nasledovnom zložení:
 - a) za objednávateľa:
 - b) za zhotoviteľa: Ing. Juraj Kurtulík
2. V prípade zmeny osôb určených v bode 1. písm. a) a b) tohto článku zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od vykonania zmeny, upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vykonaní zmeny a oznámiť druhej zmluvnej strane novú osobu určenú na výkon pozície.

Článok VI.

Podmienky zhotovenia Diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu Diela, na základe výzvy na prevzatie staveniska zaslanej objednávateľom zhotoviteľovi (ďalej aj len ako „výzva“), v termíne určenom na prevzatie podľa výzvy. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne uvedenom vo výzve, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu za omeškanie s prevzatím staveniska o viac ako 3 dni, a to vo výške 0,1% denne z ceny Diela do prevzatia staveniska a zároveň má právo odstúpiť od tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie Diela, t.j. od odovzdania staveniska až do úplného zhotovenia a odovzdania Diela.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom aj odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii. Náklady na energie vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojev a meračov znáša zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na Diele požiadať správcov, prípadne vlastníkov sietí o vytýčenie existujúcich sietí a káblov (SPP, SSE, Slovak Telekom, StVS, a pod.), aby počas realizácie prác nedošlo k ich poškodeniu. V súlade s predchádzajúcou vetou je zhotoviteľ povinný realizovať zemné práce pri styku s podzemnými inžinierskymi sieťami výlučne ručne.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita

vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

6. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečenia ďalších potrebných povolení, určenia dočasného dopravného značenia, rozhodnutia o čiastočnej, respektíve úplne uzávierky cesty, určenia trvalého dopravného značenia zabezpečiť a uhradiť Zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela.
8. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
9. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
10. Počas realizácie Diela je zhotoviteľ povinný dodržať všetky príslušné platné normy, technologické a bezpečnostné predpisy a postupy.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa. Predovšetkým, ale nie výlučne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich objednávateľovi ako stavebníkovi z § 3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006, k čomu mu udeľuje objednávateľ poverenie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr však v deň zahájenia realizácie Diela) informovať objednávateľa o osobe, ktorú poveril výkonom funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle § 3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote 3 pracovných dní)

informovať objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.

12. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
13. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
14. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie Diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe. Zaväzuje sa na vlastné náklady odstrániť všetok odpad vzniknutý jeho činnosťou. Zriadenie, prevádzka, prípadná likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie staveniska sú súčasťou ceny Diela. V prípade vzniku stavebných odpadov je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich likvidáciu alebo zhodnotenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pričom všetky súvisiace náklady znáša zhotoviteľ.
16. Objednávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
17. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
18. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie Diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.
19. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie Diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
20. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
21. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
22. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

23. Pre odovzdanie predmetu zmluvy/Diela platí:
- Zmluvné strany pristúpia k odovzdaniu a prevzatiu Diela potom, ako zhotoviteľ riadne vykoná všetky stavebné a iné práce a dodávky podľa tejto zmluvy,
 - O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany vyhotovia osobitný písomný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Protokol“) podpísaný oboma zmluvnými stranami. Protokol bude obsahovať aj súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú) a dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, pričom platí, že ak táto lehota nebude v Protokole uvedená, zmluvné strany si dohodli lehotu 15 dní, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať Protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie
 - Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté Objednávateľom až po úplnom odstránení všetkých väd a nedorobkov vrátane tých, ktoré sú uvedené v Protokole a po potvrdení tejto skutočnosti v Protokole oboma zmluvnými stranami.
24. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach všetky dokumenty nevyhnutné k riadnemu užívaniu a prevádzke Diela.
25. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
26. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.
27. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela podať návrh na kolaudáciu stavby najskôr do 14 dní od odovzdania diela podľa bodu 23. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť podať návrh na kolaudáciu stavby je zo strany zhotoviteľa splnená ak návrh na kolaudáciu stavby je podaný príslušnému stavebnému úradu a obsahuje všetky náležitosti a prílohy v zmysle zákona č. 25/2025 Z.z. (Stavebný zákon) tak, aby bolo možné návrhu vyhovieť a stavbu skolaudovať s výnimkou náležitostí a dokladov preukazujúcich majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou, ktoré zhotoviteľ bez svojej viny nemohol k návrhu priložiť a ktoré v zmysle bodu 28 tohto článku zmluvy príslušnému úradu alebo zhotoviteľovi predkladá Objednávateľ. Skutočnosť, že v lehote podľa tohto bodu zhotoviteľ nemá od objednávateľa k dispozícii všetky doklady preukazujúce majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod Dielom nie je prekážkou podania návrhu na kolaudáciu stavby a zhotoviteľ je povinný návrh v zmysle tohto bodu podať prípadne aj bez týchto dokladov.
28. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že ku kolaudácii Diela podľa predchádzajúceho bodu je potrebné vykonať majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod Dielom, toto majetkovoprávne vysporiadanie zabezpečuje Objednávateľ na svoje náklady, ak sa výslovne so Zhotoviteľom nedohodne inak. Doklady preukazujúce majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod Dielom Objednávateľ predloží priamo príslušnému stavebnému úradu alebo dodá Zhotoviteľovi, ktorý doklady priloží k návrhu na kolaudáciu stavby. Ostatné povinnosti zhotoviteľa týmto nie sú dotknuté v žiadnom rozsahu.

Článok VII. Subdodávateľia

1. Zhotoviteľ je oprávnený uskutočňovať Dielo prostredníctvom subdodávateľov za podmienok uvedených v tomto článku zmluvy. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy.
2. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: % -ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu ods. 1 tohto článku zmluvy.
5. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť subdodávateľa sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VIII. Platobné podmienky

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná nasledovne:
 - a) Prvá časť ceny Diela zodpovedajúca 90% celkovej ceny Diela s DPH podľa čl. III. bod 2 tejto zmluvy bude fakturovaná po odovzdaní diela v súlade s čl. VI. bod 23. Prílohou faktúry musí byť Súpis vykonaných prác odsúhlasený Objednávateľom a Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.
 - b) Druhá časť ceny Diela zodpovedajúca 10% celkovej ceny Diela s DPH podľa čl. III. bod 2 tejto zmluvy bude fakturovaná po podaní návrhu na kolaudáciu Diela v súlade s čl. VI. bod

27 a 28 zmluvy. Prílohou faktúry musí doklad preukazujúci podanie návrhu na kolaudáciu príslušnému stavebnému úradu a vyjadrenie stavebného úradu (resp. iný spôsob preukázania), z ktorého vyplýva, že návrh na kolaudáciu je z obsahovaného hľadiska úplný v súlade s dojednaním zmluvných strán podľa čl. VI. bod 27 a 28 zmluvy.

2. Cena diela je splatná na základe faktúry s tým, že Zhotoviteľ vystaví príslušnú faktúru do piatich dní od splnenia podmienok na fakturáciu podľa predchádzajúceho bodu. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom, spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
4. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, Objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť dorúčením doplneného/prepracovaného dokladu Objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy zriadiť v prospech objednávateľa zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „**Zábezpeka**“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo Zábezpeky svoje nároky z väd Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bola dohodnutá vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH a zhotoviteľ je povinný ju zložiť na účet objednávateľa SK28 8180 0000 0070 0057 4743 pred podpisom tejto zmluvy. Neposkytnutie Zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť, resp. nepristúpiť k podpisu zmluvy. Zábezpeka podľa tohto bodu bude v nepoužitej časti vrátená zhotoviteľovi do 10 pracovných dní po odovzdaní Diela, nie však skôr ako zhotoviteľ zriadi v prospech objednávateľa garančnú zábezpeku podľa bodu 5 tohto článku zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení garančnej zábezpeky vo výške 5% z celkovej ceny Diela bez DPH za zabezpečenie záväzkov zhotoviteľa počas záručnej doby, a to vo forme bankovej záruky (ďalej len „**Banková záruka**“). Zhotoviteľ je povinný Bankovú záruku zriadiť v prospech objednávateľa pred odovzdaním Diela vo výške 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celého trvania záručnej doby a musí slúžiť na uspokojenie všetkých záväzkov zhotoviteľa, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením zo Zmluvy počas záručnej doby v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zriadenie Bankovej záruky objednávateľovi preukázať potvrdením banky o zriadení bankovej záruky, z ktorého budú vyplývať konkrétne podmienky zriadenia a plnenia z bankovej záruky, pričom skončenie bankovej záruky musí byť viazané na písomný súhlas Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ Bankovú záruku nezriadi v súlade s týmto článkom Zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať Bankovú záruku a vyžadovať inú formu zabezpečenia. Samostatnou písomnou dohodou sa zmluvné strany môžu dohodnúť aj na inej forme zabezpečenia podľa tohto bodu zmluvy.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom v súlade s čl. VI bod 23. Záručná doba uvedená v prvej vete sa predlžuje o 12 mesiacov v prípade, ak sa vyskytne akákoľvek vada na Diele v poslednom roku jej trvania a/alebo ak sa počas záručnej doby uvedenej v prvej vete opakovane vyskytne rovnaký druh vady. Záruka sa tiež predlžuje o dobu, počas ktorej sa odstraňujú reklamované vady, vrátane doby, počas ktorej k odstraňovaniu väd nemohlo dôjsť alebo nedošlo v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok alebo iných okolností nezávislých od vôle objednávateľa.
4. Záruka sa vzťahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby Diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia Diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného Diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa, alebo od zmluvy odstúpiť.

Článok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinností dodať dielo riadne a včas podľa článku IV. ods. 1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny Diela s DPH, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinností.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktorejkoľvek z povinností definovaných v článku IX. ods. 5 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur), a to za každý deň omeškania so splnením každej tejto povinnosti.

3. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela vrátane DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
5. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto článku dotknuté.

Článok XI. Odstúpenie od Zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie Diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné Zmluvy podľa článku VI. ods. 2 tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa článku VIII. ods. 4 tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom,
 - ak Zhotoviteľ mešká s odovzdaním Diela v lehote podľa článku IV. odsek 1 zmluvy,
 - ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy (ako tie čo sú uvedené vyššie v tomto odseku) a toto porušenie neodstráni ani do 15 dní potom, čo ho objednávateľ na toto odstránenie vyzval resp. v tejto lehote neodstráni negatívne následky

tohto porušenia.

Článok XII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, príp. dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prerušenia alebo zastavenia prác z akýchkoľvek dôvodov (okrem dôvodov podľa ods. 1 tohto článku zmluvy), nemá zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na úhradu nákladov počas doby prerušenia alebo zastavenia prác.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Zrušenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatie zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá),

súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Počítanie lehôt

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia moc

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

Nadpisy

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik Zmluvy

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Započítanie

Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítvať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

Zmluvná pokuta

Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Zmeny právneho poriadku

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Prechod práv a povinností

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

Interpretácia

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

Platnosť a účinnosť

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Platnosť uvedených údajov

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia Zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Voľba práva a právomoci

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Súčasť Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet

Príloha č. 2 – Identifikácia projektovej dokumentácie

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa **11. 08. 2026**

V Predmieri, dňa **- 7. 08. 2026**

Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja,
Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

DOSA Slovakia, s. r. o.

Predmier 425

013 51 Predmier

013 51 Predmier

DOSA Slovakia, s.r.o.

Ing. Juraj Kurtulík, Ing. Marek Kocian,
konatelia

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 26_18

Stavba: Rekonštrukcia mostného objektu M6308 most cez Brodziansky potok v obci Brodzany

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ:
Správa ciest TSK

IČO: 37915568
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO: 36412678
IČ DPH: SK2020109443

Projektant:
DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Čelková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	439 990,00
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	439 990,00	101 197,70

Cena s DPH	v	EUR	541 187,70
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 26_18

Stavba: Rekonštrukcia mostného objektu M6308 most cez Brodziansky potok v obci Brodzany

Miesto: Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Čelková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		439 990,00	541 187,70
000-00	VRN - Všeobecné položky	78 915,00	97 065,45
101-00	Reozšírenie cesty II/593	37 214,00	45 773,22
201-00	Most M6308 cez Brodziansky potok	323 861,00	398 349,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mostného objektu M6308 most cez Brodziansky potok v obci Brodzany

Objekt:

000-00 - VRN - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

22. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

37915568

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čelková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 915,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

78 915,00

23,00%

18 150,45

Cena s DPH

v EUR

97 065,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia mostného objektu M6308 most cez Brodziansky potok v obci Brodzany

Objekt: 000-00 - VRN - Všeobecné položky

Miesto:		Dátum:	22. 6. 2026
Objednávateľ:	Správa ciest TSK	Projektant:	DAQE Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ:	DOSA Slovakia, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Čelková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	78 915,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	78 915,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mostného objektu M6308 most cez Brodziansky potok v obci Brodzany

Objekt:

101-00 - Reozšírenie cesty II/593

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

22. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

37915568

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čelková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 214,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

37 214,00

23,00%

8 559,22

Cena s DPH

v EUR

45 773,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia mostného objektu M6308 most cez Brodziansky potok v obci Brodzany

Objekt: 101-00 - Reozšírenie cesty II/593

Miesto: Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ: Správa ciest TSK Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Čelková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	37 214,00
HSV - Práce a dodávky HSV	37 214,00
1 - Zemné práce	12 407,46
2 - Zakladanie	415,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 904,80
4 - Vodorovné konštrukcie	847,60
5 - Komunikácie	16 267,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 371,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mostného objektu M6308 most cez Brodziansky potok v obci Brodzany

Objekt:

201-00 - Most M6308 cez Brodziansky potok

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

22. 6. 2026

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

IČO:

37915568

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Čelková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

323 861,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

323 861,00

23,00%

74 488,03

Cena s DPH

v EUR

398 349,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia mostného objektu M6308 most cez Brodziansky potok v obci Brodzany

Objekt:
201-00 - Most M6308 cez Brodziansky potok

Miesto:
Objednávateľ: Správa ciest TSK
Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o.

Dátum: 22. 6. 2026
Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Čelková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	323 861,00
HSV - Práce a dodávky HSV	317 862,30
1 - Zemné práce	59 658,56
2 - Zakladanie	20 385,89
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	48 104,61
4 - Vodorovné konštrukcie	26 425,60
5 - Komunikácie	80 002,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	83 285,56
PSV - Práce a dodávky PSV	5 998,70
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 449,58
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 549,12

V Prievidzi dňa: 03. JÚN 2026

Spracovateľ

daqe

DAQE Slovakia s.r.o.
Pribylova 8953/62, 010 01 Žilina

Objednatel



Správa ciest TSK
Brnianska 1997/3, Zlatovce, 911 05 Trenčín


Číslo paré



Názov stavby (zmluva):

REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU M6308
MOST CEZ BRODZIANSKY POTOK V OBCI BRODZANY

PROJEKT STAVBY

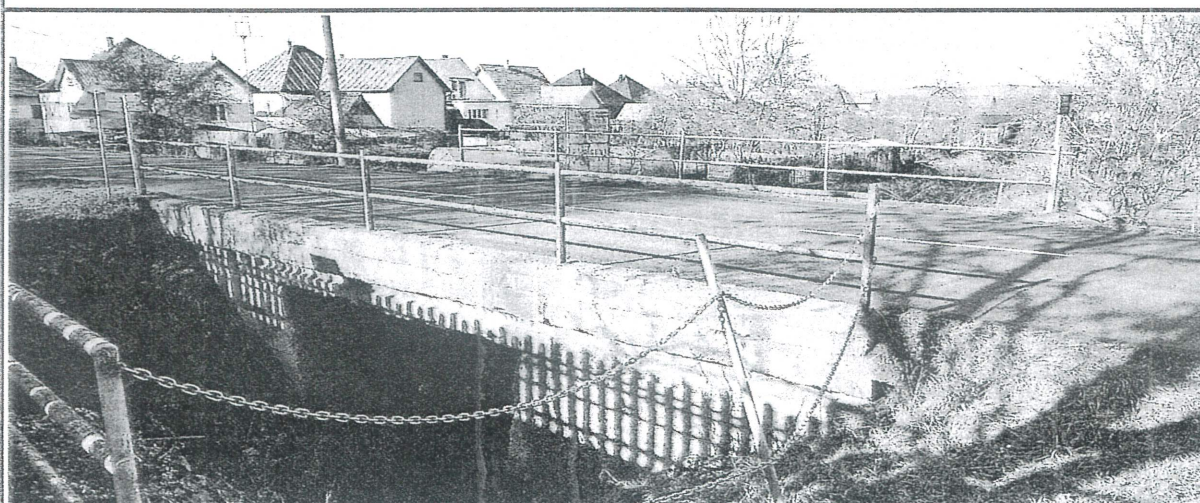[illegible]

Manažér projektu:			
HIP:	Ing. Lukáš Rolko		
Vypracoval:	kolektív		
Kontroloval:	Ing. Lukáš Rolko		
Kraj, okres:	Trenčiansky, Partizánske		
Kataster:	Brodzany		
Archívna číslo	1425-03	Datum:	06/2025

Vyhlásenie uchádzača - subdodávateľa

k Výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania s predmetom zákazky: *Rekonštrukcia mostného objektu M6308 most cez Brodziansky potok v obci Brodzany.*

Názov alebo obchodné meno uchádzača:

DOSA Slovakia, s.r.o.,


Adresa alebo sídlo uchádzača:

Predmier 425, 013 51 Predmier


.....

že uchádzač neplánuje využiť služby subdodávateľov.

V Predmieri,



Ing. Juraj Kurtulík
Konateľ, DOSA Slovakia, s.r.o.,



Ing. Marek Kocian
Konateľ, DOSA Slovakia, s.r.o.,
